


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	<b>Обхват: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион В. Търново за общините В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.</b>	2992 days?	Wed 20.6.07	Mon 29.6.16	20.6								29.6
3	<b>1. Предимствително проучване</b>	1761 days	Mon 2.2.09	Thu 28.11.10			20.2						28.11
4	ПИП по поръчка на МОСВ по проект EuropeAid/124485 (извън обхвата на проекта)	513 days	Mon 2.2.09	Tue 1.11.10									
5	Коригиране на ПИП от Бенефициента според забележките на ЕРГ на МОСВ	497 days	Mon 30.7.12	Thu 23.11.14									
6	<b>2. Финансов/ и икономически анализи</b>	1974 days	Wed 24.2.10	Thu 28.11.15				24.9					28.11
7	Първоначални ФИА по поръчка на МОСВ по проект EuropeAid/124485 (извън обхвата на проекта)	189 days?	Wed 24.2.10	Tue 31.8.10									
8	Коригиране на ФИА от Бенефициента според забележките на ЕРГ	407 days?	Mon 30.7.12	Thu 23.11.14									
9	<b>3. Оценка на въздействието върху околната среда</b>	1597 days?	Mon 18.2.08	Mon 2.7.12			18.2				2.7		
10	Изготвяне на Доклад за ОВОС	267 days	Mon 18.2.08	Wed 13.11.08									
11	Процедури по ОВОС, вкл. издаване на решение по ОВОС	189 days?	Tue 18.11.08	Thu 30.4.09									
12	Съдебни процедури във връзка с обжалване на решението по ОВОС	1146 days?	Fri 15.5.09	Mon 2.7.12									
13	<b>4. Преценка от необходимостта за ОВОС</b>	1906 days	Tue 22.1.08	Tue 9.4.13			22.1						9.4
14	Преценка от необходимостта за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на РСУО	12 days	Tue 22.1.08	Mon 4.2.08									
15	Преценка от необходимостта за ОВОС на инвестиционно предложение на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на РСУО (без съобщителна връзка)	104 days	Wed 6.6.12	Mon 17.9.12									
16	Допълване преценка от необходимостта за ОВОС – съобщителна връзка	384 days	Thu 25.3.12	Tue 9.4.13									
17	<b>5. Оценка за съвместимостта в предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000</b>	15 days	Fri 25.7.08	Thu 20.8.08			25.7						28.8
18	<b>6. Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програмата/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 (в случай, че не са провежда заедно с т.3)</b>	0 days	Fri 1.11.13	Fri 1.11.13									
19	<b>7. Издаване на комплексно разрешително</b>	782 days	Fri 26.8.11	Tue 16.10.13						26.8			16.10
20	Подготовка на заявление за издаване на КР по ЗООС	46 days	Fri 26.8.11	Mon 10.10.11									
21	Допълване на заявление за издаване на КР по ЗООС	432 days	Fri 24.3.12	Tue 30.4.13									
22	Подготовка на План за собствен мониторинг по компонент „Води“ и План за закриване и рекултивация на депото на площадка №5	31 days	Thu 3.5.12	Wed 23.5.12									
23	Процедури по издаване на КР	797 days	Thu 20.10.11	Tue 15.10.13									
24	<b>8. Други разрешителни или документи, свързани с проекта и демонстриращи неговата спелост на готовност</b>	892 days	Fri 26.8.11	Wed 4.12.13						26.8			4.12
25	Разработване на задание за проучване и проектиране на ПУП-ПЗ и задание за проектиране на ПУП – ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура на площадка №5 (без съобщителна връзка)	109 days	Fri 26.8.11	Wed 29.2.12									
26	Преценка от необходимостта от ЕС на ПУП – ПЗ на площадка №5	11 days	Mon 26.11.11	Sun 3.12.11									
27	Проектиране на ПУП-ПЗ за площадка № 5 и ПУП-ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване и пътна връзка	59 days	Thu 3.3.12	Thu 21.6.12									
28	Процедиране на ПУП-ПЗ за площадка №5	203 days	Thu 12.7.12	Wed 30.1.13									
29	Процедиране на ПУП-ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване и пътна връзка	203 days	Thu 12.7.12	Wed 30.1.13									

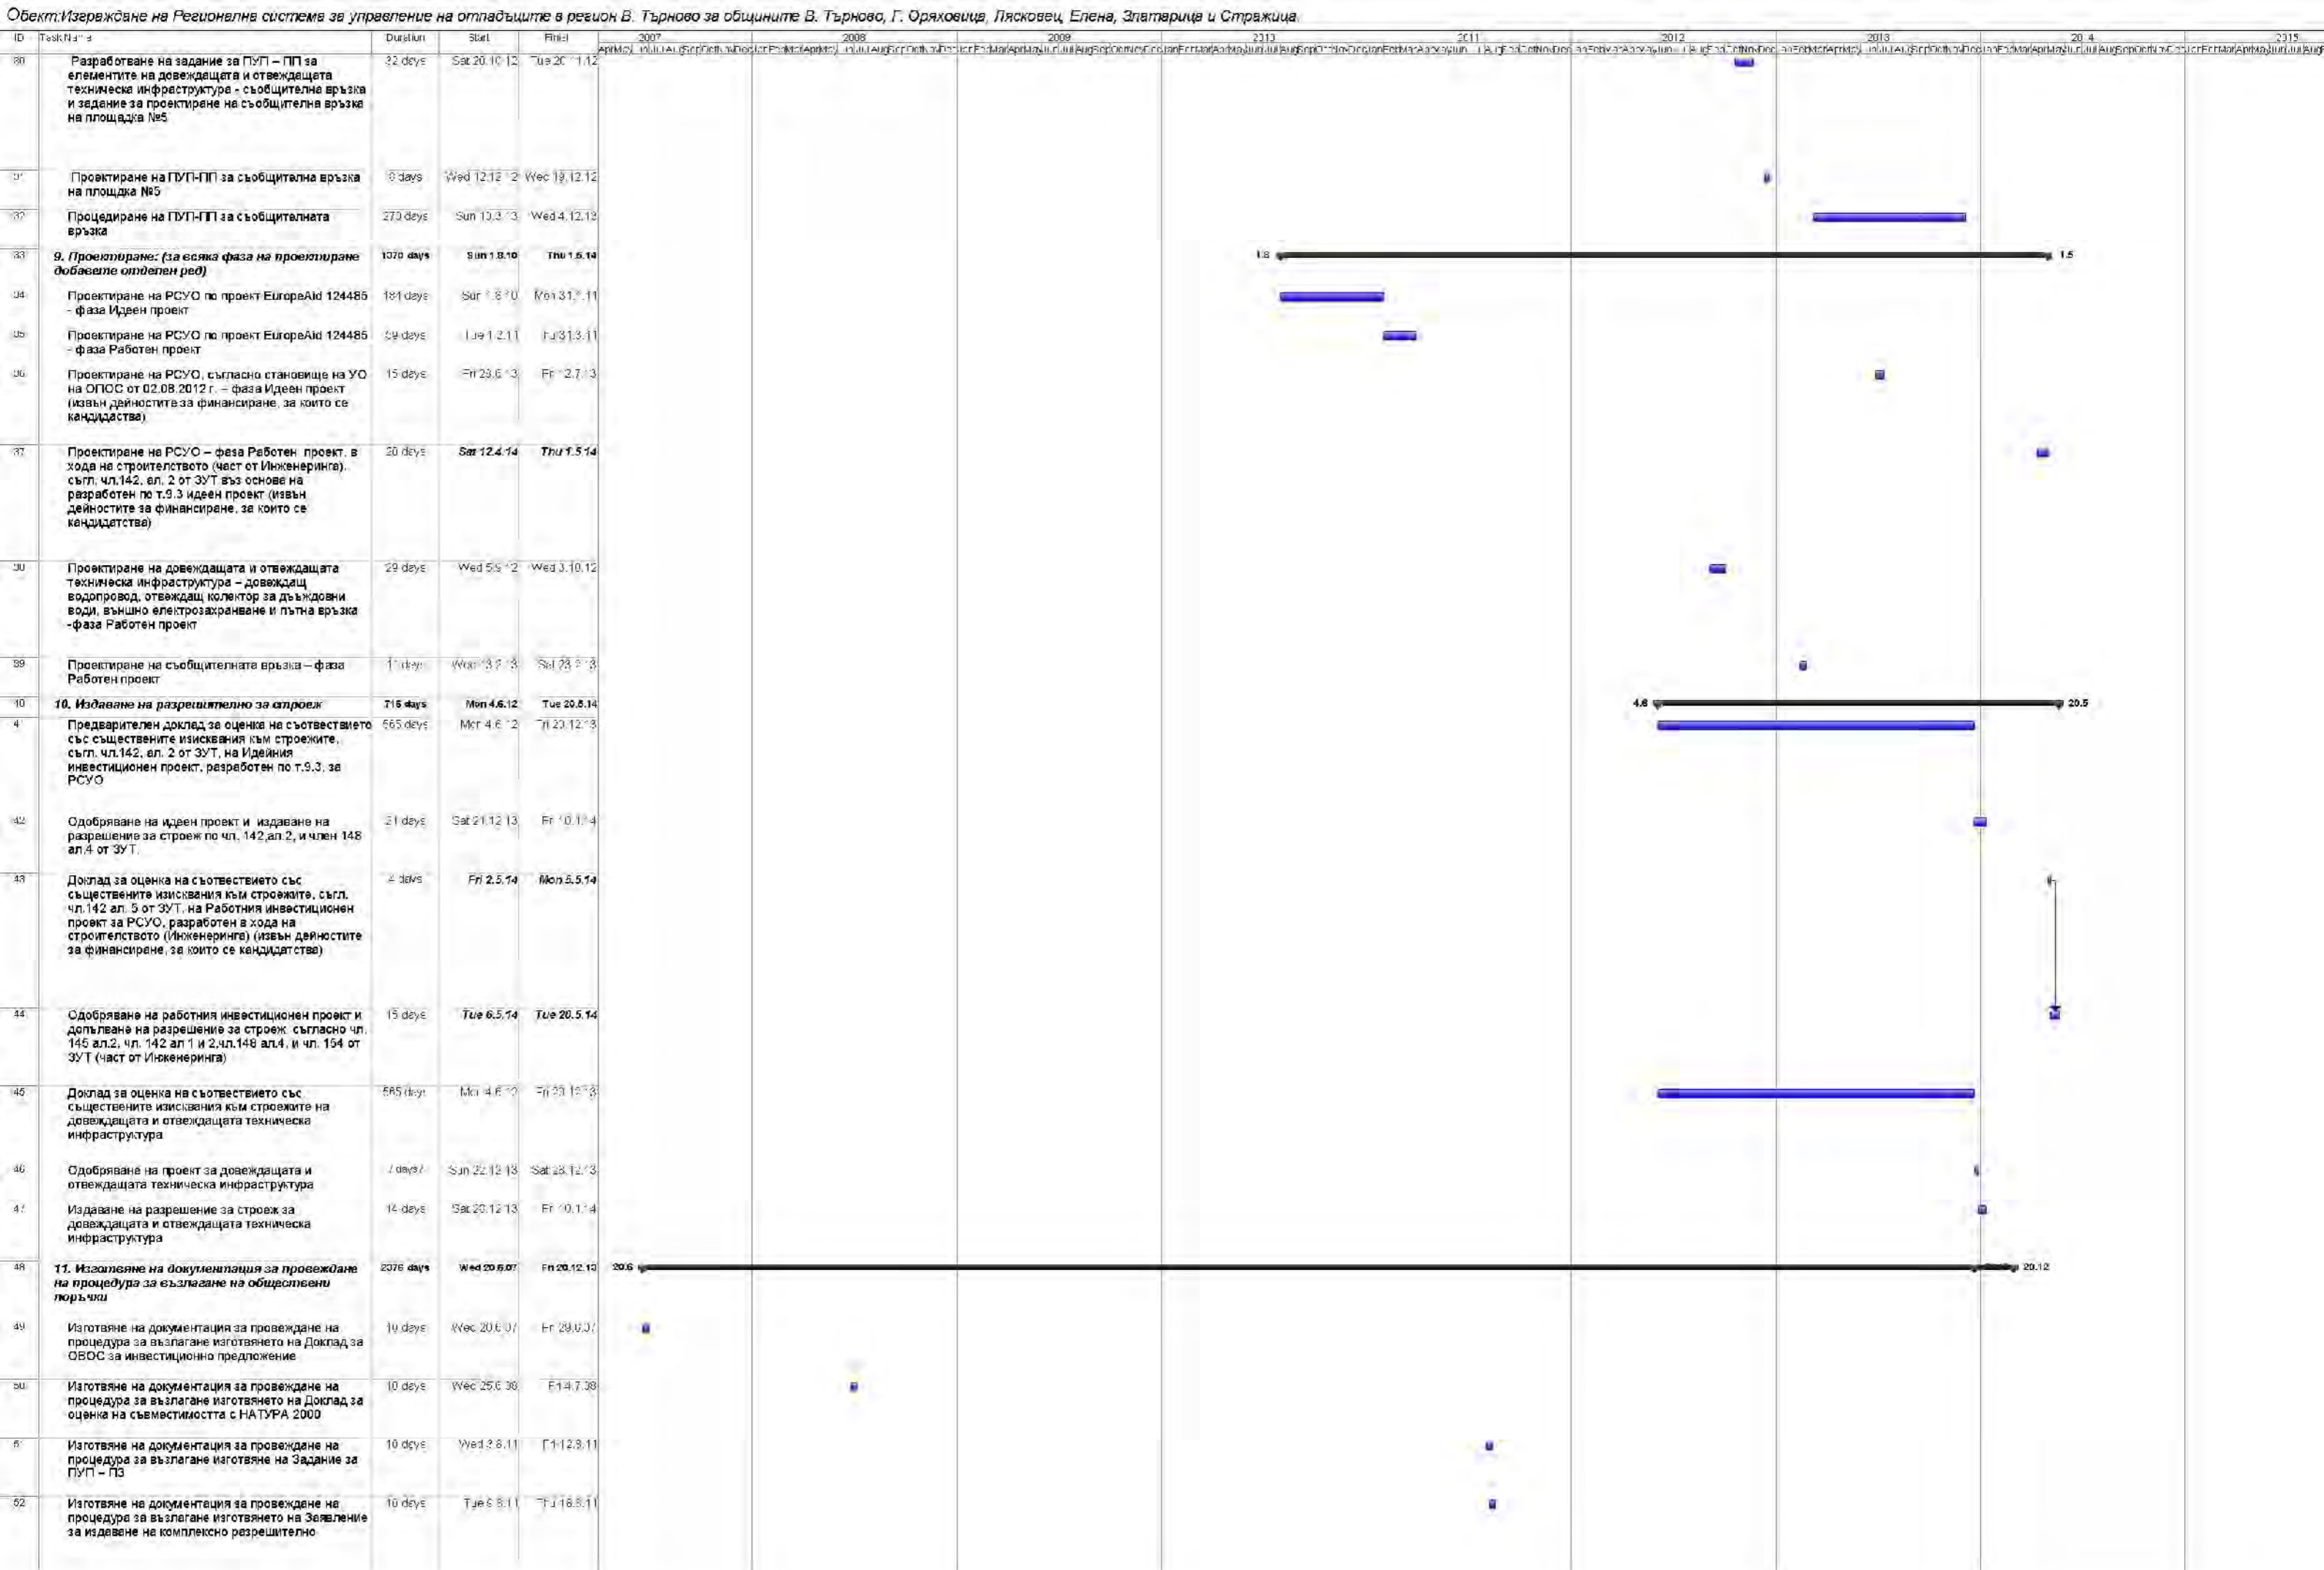

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
53	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изработването на план за собствен мониторинг по компонент „Бодиг“ и план за рекултивация на депото на площадка №5	11 days	Tu 23.8.12	Mon 2.9.12									
54	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на проучване и проектиране на ГУП – ПЗ на площадка №5 и ПУП – ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура (без съобщителна връзка)	14 days	ue 8.8.12	ue 20.8.12									
55	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на проучване и изработване на инвестиционни проекти във фаза Работен проект за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура (без съобщителна връзка)	15 days	Tue 22.8.12	Tue 5.9.12									
56	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвянето на комплексен доклад за оценка на съвместия на инвестиционните проекти за изграждането на РСУО и довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	15 days	Thu 5.9.12	Thu 18.9.12									
57	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвянето на задание на ПУП – ПП за съобщителна връзка	10 days	Wed 5.9.12	Fri 14.9.12									
58	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане изготвянето на документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по изграждане на РСУО	15 days	Tu 18.11.12	Tu 30.11.12									
59	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на проучване и проектиране на ПУП – ПП за съобщителна връзка	19 days	tu 10.1.13	fr 30.1.13									
60	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за съобщителна връзка	12 days	Thu 3.1.13	Mon 14.1.13									
61	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за техническа помощ на ЕУП	45 days	Sun 13.8.12	Tue 2.10.12									
62	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за мерки за информация и публичност	18 days	tu 22.2.13	Mon 8.3.13									
63	Изготвяне на документация за възлагане на доставка на компютърна техника, софтуер и офис оборудване за ЕУП	10 days	Tue 1.3.13	Wed 29.3.13									
64	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на дейност за одит на проекта	355 days	Mon 11.3.13	Fri 28.2.14									
65	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на упражняване на строителен надзор и Инженер по FIDIC	45 days	Wed 6.3.13	Fri 22.3.13									
66	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на строителството на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	47 days	Tu 29.3.13	Tue 14.5.13									
67	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на инженеринг (проектиране и строителство) на РСУО по договорните условия на FIDIC – Жълта книга	47 days	Tu 29.3.13	ue 14.5.13									
68	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на авторски надзор за изграждане на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор, външно електрохранване и пътна връзка	13 days	Wed 15.5.13	Mon 27.5.13									
69	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на авторски надзор за изграждане на съобщителната връзка	18 days	Wed 15.5.13	Mon 27.5.13									
70	Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново (извън дейностите за финансиране, за	15 days	Wed 8.5.13	Wed 22.5.13									

ID	Task Name	Duration	Start	End	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
71	Изготвяне на документация за възлагане за доставка на експлоатационна механизация	46 days	Wed 19.8.'13	Fri 2.8.'13									
72	Изготвяне на документация за възлагане за доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци, включително актуализиране, във връзка с обявяване по обособени позиции	183 days	Wed 19.8.'13	Fri 23.12.'13									
73	<b>12. Очаквана дата на обявяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки:</b>	2655 days	Mon 2.7.'07	Sun 29.6.'14	2.7								29.6
74	Услуги за изготвяне на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение	18 days	Mon 2.7.'07	Tue 17.7.'07									
75	Услуги за изготвяне на Доклад за оценка на съвместимостта с НАТУРА 2000	20 days	Sat 5.7.'08	Thu 24.7.'08									
76	Услуги за изготвяне и съгласуване на Задание за ПУП – ПЗ	21 days	Fri 5.8.'11	Fri 25.8.'11									
77	Услуги за изготвяне на Заявление за издаване на комплексно разрешително	7 days	Fri 19.8.'11	Fri 25.8.'11									
78	Услуги по изработване на план за собствен мониторинг по компонент „Води“ и план за рекултивация на депото на площадка №5	30 days	Tue 3.4.'12	Wed 2.5.'12									
79	Услуги за проучване и проектиране на ПУП – ПЗ на площадка №5 и ПУП – ПЗ за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	45 days	Wed 21.4.'12	Wed 2.5.'12									
80	Услуги за проучване и изработване на инвестиционни проекти във фаза Работен проект за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура (без съобщителна връзка)	51 days	Wed 8.5.'12	Tue 4.9.'12									
81	Услуги за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционните проекти за изграждането на РСУО и довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура	611 days	Fri 23.4.'12	Fri 23.12.'13									
82	Услуги за изготвяне и съгласуване на задание на ПУП – ПЗ за съобщителна връзка	35 days	Mon 17.8.'12	Fri 19.10.'12									
83	Услуги за изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по изграждане на РСУО	35 days	Mon 8.12.'12	Sun 6.1.'13									
84	Услуги за проучване и проектиране на ПУП – ПЗ за съобщителна връзка	8 days	Mon 3.12.'12	Mon 13.12.'12									
85	Услуги за проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за съобщителна връзка	25 days	Tue 5.1.'13	Fri 8.2.'13									
86	<b>Услуги за техническа помощ на ЕУП (прекратена, предстои обявяване до издаване на решение за избор на изпълнител)</b>	51 days	Tue 7.1.'14	Mon 7.4.'14									
87	Услуги за мерки за информация и публичност (публична покана)	55 days	Tue 7.1.'14	Fri 28.2.'14									
88	Доставка на компютърна техника, софтуер и офис оборудване за ЕУП	55 days	Tue 7.1.'14	Fri 28.2.'14									
89	Услуги за одит (отрита)	105 days	Tue 7.1.'14	Mon 21.4.'14									
90	<b>Консултант за строителен надзор и Инженер по FIDIC (прекратена, подлежи на ново обявяване до издаване на решение за избор на изпълнител)</b>	51 days	Sat 11.1.'14	Fri 11.4.'14									
91	<b>Строителство на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура (открита, прекратена, подлежи на ново обявяване до издаване на решение на комисията за избор на изпълнител)</b>	51 days	Sat 11.1.'14	Fri 11.4.'14									
92	<b>Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на РСУО по дооформените условия на FIDIC – Жълта книга (прекратена, подлежи на ново обявяване до издаване на решение на комисията за избор на изпълнител)</b>	51 days	Sat 11.1.'14	Fri 11.4.'14									
93	Авторски надзор на проектантите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор, външно електрозахранване и пътна връзка, по време на строителството (договаряне без обявяване)	60 days	Tue 21.1.'14	Fri 21.3.'14									

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
94	Авторски надзор на проектантите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура по време на строителството – съобщителна връзка, по време на строителството (договаряне без обявление)	60 days	Tue 21.11.14	Fri 21.3.14									
95	Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново (извън дейностите за финансиране, за които се кандидатства)	19 days	Mon 17.6.13	Wed 26.6.13									
96	Доставка на експлоатационна механизация, доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци (по обособени позиции) (с обособени позиции по видове) (открита)	150 days	Fri 8.1.14	Sun 29.6.14									
97	<b>13. Закупуване/придобиване на земи / учредяване на ограничени вещни права върху земи</b>	253 days	Thu 21.2.13	Thu 31.10.13									
98	Оцени на недвижими имоти	6 days	Thu 21.2.13	Tue 26.2.13									
99	Публикуване на обявление за отчуждаване	17 days	Mon 18.3.13	Wed 3.4.13									
100	Издаване и публикуване на заповед за отчуждаване	24 days	Wed 8.5.13	Fri 31.5.13									
101	Изплащане на парично обезщетение (придобиване на недвижими имоти)	153 days	Sat 15.6.13	Thu 5.10.13									
102	<b>14. Промяна на предназначението на земята</b>	224 days	Fri 22.3.13	Thu 31.10.13									
103	<b>15. Строителство</b>	486 days?	Sat 1.3.14	Mon 29.6.15									
104	Изпълнение на договор за техническа помощ на СУП	448 days?	Tue 8.4.14	Mon 29.6.15									
105	Създаване и функциониране на ЕУП във довеждащата община	459 days?	Tue 1.4.14	Mon 29.6.15									
106	Доставка на компютърни материали, компютърна техника, софтуер и офис оборудване за работата на ЕУП	338 days?	Sat 1.3.14	Sun 1.2.15									
107	Изпълнение на договор за информативна публичност на проекта	457 days?	Sat 1.3.14	Sun 31.3.15									
108	Изпълнение на договор за одит на проекта	370 days?	Sat 24.5.14	Sun 21.3.15									
109	Изпълнение на дейността на строителен надзор	444 days	Sat 12.4.14	Mon 29.6.15									
110	Изпълнение на дейността на строителен надзор до приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване	304 days?	Sat 12.4.14	Tue 31.9.15									
111	Изпълнение на дейността на строителен надзор и на Изпълнителния Фирма (ИФ) при приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване	90 days?	Wed 1.4.15	Mon 29.6.15									
112	Изпълнение на авторския надзор на проектантите при изпълнение на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - довеждащ водогребен, отвеждащ колектор, външно ел. и пътна връзка	384 days?	Sat 12.4.14	Thu 30.4.15									
113	Изпълнение на авторския надзор на проектантите при изпълнение на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - общински център	384 days?	Sat 12.4.14	Thu 30.4.15									
114	Период на Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на технологично оборудване на РСУО (част от Инженерния) до Протокол обр. 15	225 days	Wed 21.5.14	Wed 31.12.14									
115	Период на изпълнение на строителство на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура до Протокол обр. 15	225 days	Sat 12.4.14	Thu 19.12.14									
116	Изпълнение на договор за доставка на експлоатационна механизация	154 days?	Mon 30.6.14	Sun 11.11.14									
117	Изпълнение на договор за доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци	31 days?	Tue 8.1.15	Thu 30.4.15									
118	<b>16. Въвеждане в експлоатация</b>	194 days?	Thu 18.12.14	Mon 29.6.15									
119	Въвеждане в експлоатация на РСУО (до издаване на разрешение за ползване)	60 days	Thu 1.1.15	Tue 31.3.15									
120	Въвеждане в експлоатация на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура (до издаване на разрешение за ползване)	104 days	Thu 18.12.14	Tue 31.3.15									
121	Срок за съобщаване на дефекти след въвеждане в експлоатация	90 days?	Thu 1.1.15	Tue 21.3.15									
122	Срок за съобщаване на дефекти след въвеждане в експлоатация	90 days?	Wed 1.4.15	Mon 29.6.15									
123	ОБЩАГРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА	2932 days?	Wed 20.6.07	Mon 29.6.15									
124	ОБЩАГРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЕФГ	547 days?	Mon 30.12.13	Mon 29.6.15									
